

Retrospectiva


Sprint 2

António Pereira – 1220754

Aleandro Vieira

João Pinto

Carlos Santos

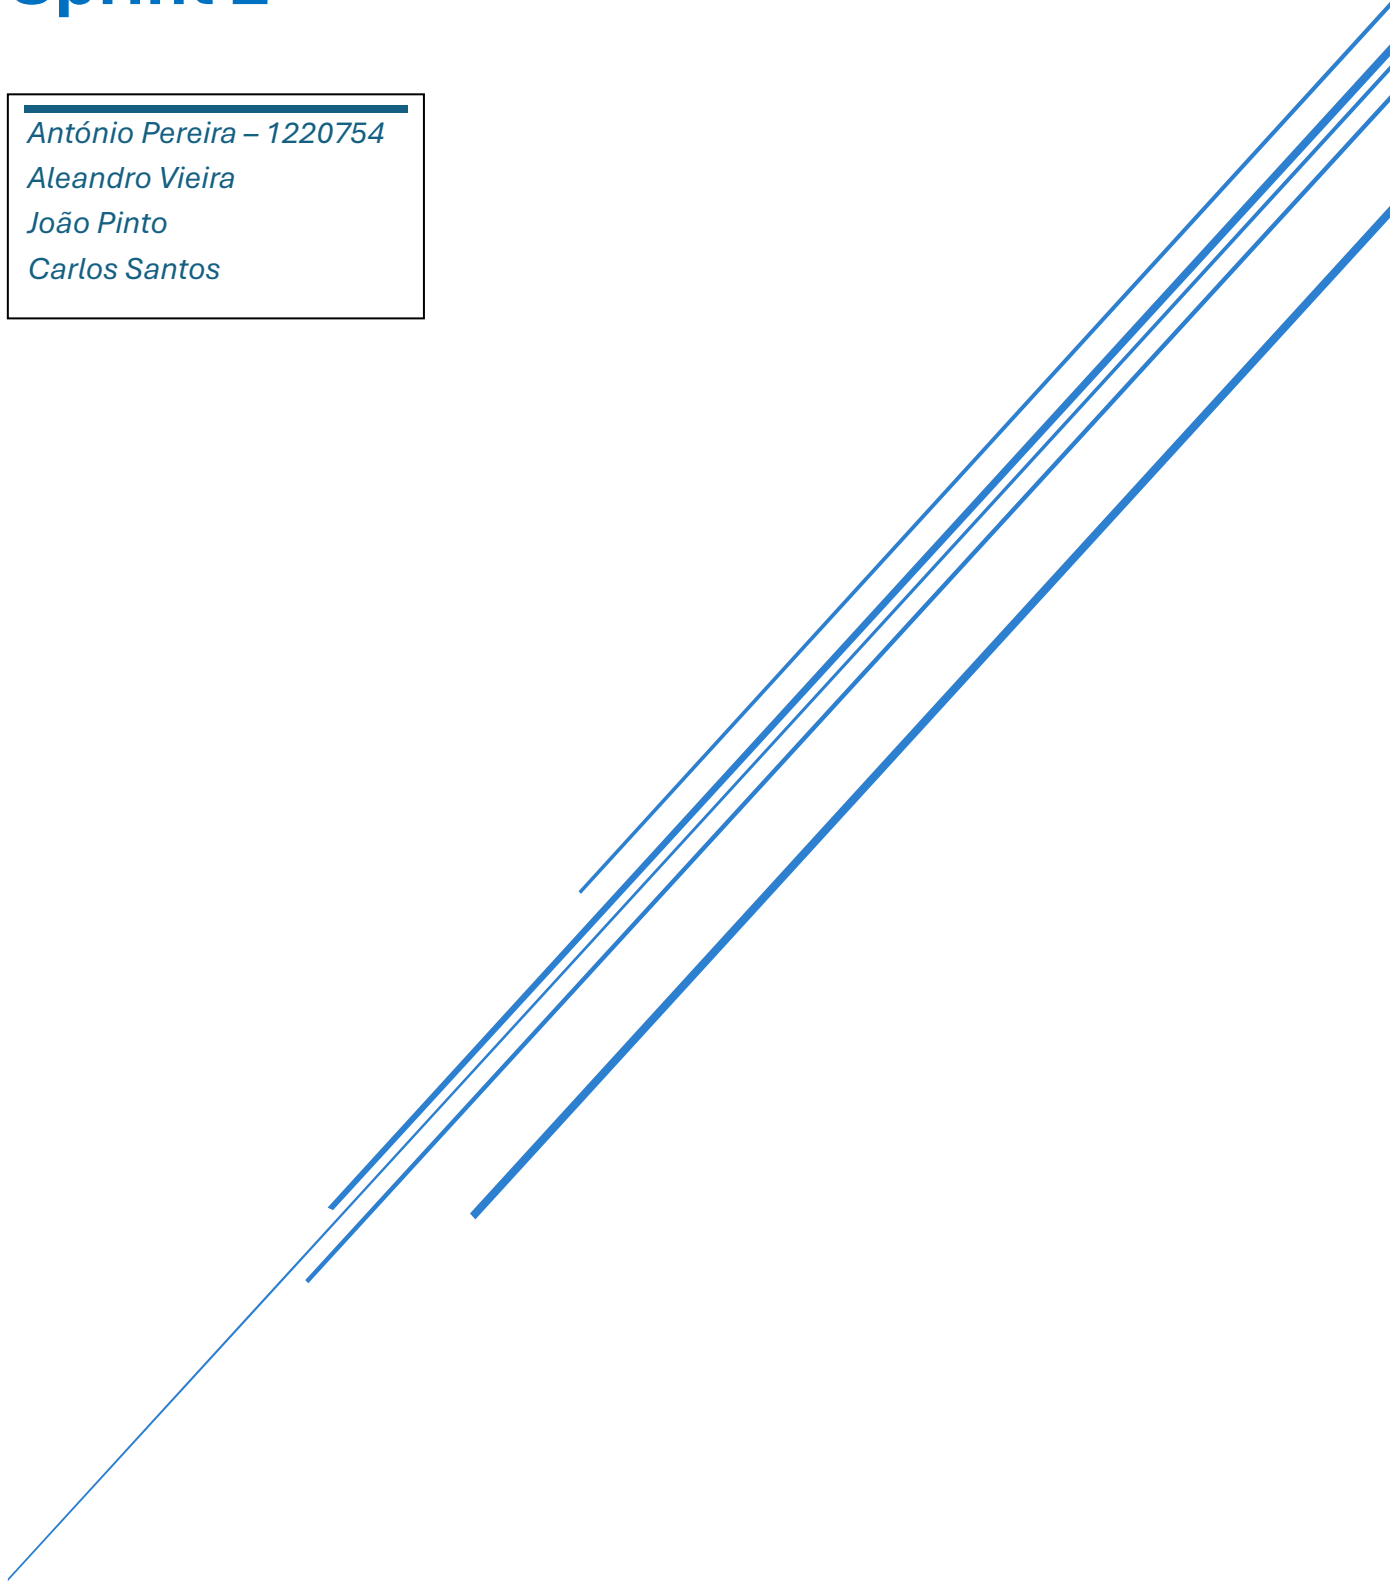

1. Objetivo da Retrospectiva	2
2. Resumo do Sprint 2	2
3. Pontos Positivos	4
4. Pontos a Melhorar	4
5. Ações Corretivas Definidas	5
6. Ações Corretivas da Retrospectiva Anterior	7
7. Conclusões e Próximos Passos.....	7

1. Objetivo da Retrospectiva

O objetivo da retrospectiva do Sprint 2 foi realizar uma análise detalhada e reflexiva sobre o desempenho da equipa ao longo do ciclo de trabalho, avaliando não apenas o cumprimento dos objetivos estabelecidos, mas também os processos adotados. Durante a reunião, foram identificados pontos fortes que demonstraram o bom desempenho da equipa, assim como áreas de melhoria que precisam de ajustes para otimizar o trabalho futuro. Além disso, foram propostas ações corretivas específicas, baseadas nas observações feitas, com o intuito de resolver problemas persistentes e implementar práticas mais eficientes. Este momento de reflexão coletiva é fundamental não só para a melhoria contínua da equipa, mas também para o aprimoramento da qualidade do produto, garantindo que as entregas atendam aos requisitos de forma mais eficiente e com maior valor agregado. A retrospectiva visa, portanto, promover uma cultura de aprendizagem e adaptação dentro da equipa, assegurando que cada ciclo de trabalho seja melhor que o anterior.

2. Resumo do Sprint 2

A Sprint 2 teve como foco a implementação de diversas funcionalidades críticas para a integração e melhoria da usabilidade do sistema, além de garantir que os módulos desenvolvidos na Sprint 1 fossem bem conectados e funcionais dentro do sistema como um todo. Durante este período, a equipa trabalhou na integração da interface do utilizador (UI), onde foram abordados itens essenciais como a criação de um menu dinâmico que se ajusta com base no papel do utilizador (como paciente, admin ou doutor), e a sincronização de informações entre os módulos de planeamento, backoffice e visualização 3D.

Entre os principais itens do backlog que foram trabalhados, destacam-se:

- **Módulo de Integração:** Implementação de uma interface integrada para que o utilizador não precise alternar entre URLs do sistema, além da sincronização das informações relativas à disponibilidade de salas, escalas de operações, e dados do pessoal de saúde entre os módulos.
- **Módulo de Backoffice:** Desenvolvimento da interface de registo e gestão de utilizadores, com funcionalidades que permitem aos pacientes registar, atualizar e remover os seus dados, assim como a criação, edição e eliminação de perfis de pacientes e staff pela parte dos administradores.
- **Módulo de Planeamento:** Desenvolvimento da interface para agendamento de operações, com foco na otimização da alocação de salas

de cirurgia e recursos de pessoal, utilizando algoritmos heurísticos para gerar um cronograma eficiente dentro de um tempo razoável.

- **Módulo de Visualização 3D:** Implementação da visualização da planta do hospital/clinica em 3D, com a representação de salas de cirurgia e a possibilidade de visualização da ocupação em tempo real, incluindo modelos humanos simulando os pacientes durante a operação.
- **Módulo de GDPR:** Sensibilização e implementação das práticas de conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), com foco na identificação e tratamento dos dados pessoais dos pacientes de forma legal e ética.

Durante a Sprint 2, a equipa enfrentou alguns desafios relacionados com a **sincronização de dados entre módulos**, especialmente na integração das funcionalidades de planeamento e visualização 3D, que exigiram ajustes nos métodos de comunicação entre os diferentes componentes do sistema. Além disso, a **complexidade da implementação de uma interface unificada** que atendesse às diferentes permissões de utilizadores também foi um desafio, já que era necessário garantir que os menus e opções de acesso estivessem corretos de acordo com os papéis atribuídos.

Apesar desses desafios, a equipa conseguiu avançar significativamente no desenvolvimento das funcionalidades-chave, e várias melhorias foram implementadas em termos de **user experience (UX)**, garantindo uma navegação mais fluida e uma gestão de dados mais eficaz.

3. Pontos Positivos

- **Colaboração e Comunicação:** A comunicação dentro da equipa melhorou significativamente em relação ao Sprint anterior, com reuniões quase diárias mais eficazes e uma maior partilha de informações entre os membros. O Grupo também adotou uma abordagem mais proativa para identificar e solucionar potenciais impedimentos durante o ciclo de trabalho.
- **Entrega de Funcionalidades:** A equipa conseguiu completar com sucesso todas as funcionalidades previstas para o Sprint 2, dentro do prazo estipulado. Entre essas funcionalidades, destacam-se a integração da interface do utilizador (UI) para facilitar a navegação entre os módulos, a implementação das funcionalidades de registo e gestão de utilizadores no módulo de backoffice, e a sincronização de dados entre os módulos de planeamento e visualização 3D. A entrega foi bem-sucedida em termos de qualidade, e todas as funcionalidades foram testadas e validadas de acordo com os critérios de aceitação definidos.

4. Pontos a Melhorar

- **Definição de Tarefas:** Algumas tarefas foram definidas de forma vaga e imprecisa, o que levou a atrasos e confusão durante a execução. A falta de clareza no que era esperado de determinadas atividades resultou em mal-entendidos entre os membros da equipa, dificultando o progresso. Para o próximo sprint, é importante garantir que todas as tarefas sejam claramente detalhadas e compreendidas por todos os envolvidos, para evitar retrabalho e promover uma execução mais eficiente.
- **Gestão de Tempo:** Durante esta Sprint, a gestão do tempo revelou-se um desafio. No final da Sprint, a equipa enfrentou uma carga de trabalho muito alta. Esse aumento na carga de trabalho poderia ter sido evitado se o grupo tivesse distribuído as tarefas de forma mais equilibrada ao longo de toda a Sprint, em vez de acumular um grande volume de trabalho para a fase final. Para melhorar, é necessário planear de forma mais eficaz desde o início do Sprint, distribuindo as tarefas de maneira mais uniforme e ajustando as prioridades conforme o progresso, para garantir que o trabalho seja gerido de forma mais constante e dentro dos prazos estipulados.

- **Assiduidade às Aulas de PL (Práticas Laboratoriais):** A assiduidade nas aulas de PL foi um ponto que afetou o progresso do grupo, pois houve momentos em que algumas informações importantes foram perdidas ou não compreendidas devido à falta de presença nas sessões. Esse fator comprometeu a clareza sobre os requisitos técnicos e gerou dificuldades na execução de algumas tarefas. É essencial que todos os membros da equipa estejam presentes nas aulas de PL para garantir uma compreensão completa dos requisitos e das melhores práticas.
- **Comunicação:** Embora a equipa tenha mostrado uma melhoria significativa na comunicação em comparação com o Sprint anterior, ainda há espaço para aperfeiçoar a fluidez e a clareza das interações. Algumas informações importantes não foram partilhadas de forma eficaz, o que levou a algumas lacunas na execução das tarefas. Para a próxima Sprint, será necessário continuar a trabalhar no fortalecimento da comunicação, garantindo que todos os membros estejam alinhados e que as informações sejam transmitidas de forma mais clara e eficiente.

5. Ações Corretivas Definidas

Com base nos pontos de melhoria identificados, a equipa definiu as seguintes ações corretivas para a próxima Sprint:

- **Melhorar a Definição de Tarefas:** A partir da Sprint 3, todas as tarefas serão mais detalhadas antes de serem atribuídas, incluindo objetivos claros, critérios de aceitação e a identificação das dependências. A equipa irá garantir que todas as tarefas sejam compreendidas por todos os membros antes de serem iniciadas, reduzindo a ambiguidade e aumentando a clareza do trabalho a ser feito.
 - Evidência: A equipa utilizará e consumirá mais os recursos do GitHub estruturado, com uma descrição detalhada e critérios de aceitação específicos, além de mapear todas as dependências entre as tarefas, para garantir que todos os requisitos sejam atendidos.

- **Aprimorar a Gestão de Tempo:** A equipa implementará um sistema de estimativas mais rigoroso, utilizando o método de estimativas para envolver todos os membros na definição do tempo necessário para cada tarefa. Além disso, haverá uma análise constante da alocação de tempo, ajustando-a conforme a experiência dos Sprints anteriores, a fim de evitar sobrecarga de trabalho no final do ciclo.
 - Evidência: Será realizada uma análise das estimativas de tempo versus o tempo real de execução das tarefas na Sprint 3, e ajustes serão feitos conforme necessário. A equipa irá também utilizar ferramentas de acompanhamento de tempo para monitorar o progresso em tempo real.
- **Aumentar a Assiduidade nas Aulas de PL:** A equipa compromete-se a garantir que todos os membros estejam presentes nas aulas de PL para não perder informações cruciais para o desenvolvimento do projeto. A falta de presença será minimizada com um compromisso de participação integral nas aulas.
 - Evidência: A equipa acompanhará a assiduidade de cada membro e, se necessário, estabelecerá um plano de recuperação de conteúdo para aqueles que não puderem comparecer, garantindo que todos estejam atualizados com os requisitos e melhores práticas ensinadas nas aulas.
- **Melhorar a Comunicação:** Embora a comunicação tenha melhorado, a equipa definirá um conjunto de boas práticas de comunicação interna para garantir um fluxo contínuo e eficiente de informações. Será estabelecido um protocolo de reuniões diárias mais focadas, com uma agenda clara, para garantir que todos os membros estejam alinhados e informados sobre as mudanças ou atualizações relevantes.
 - Evidência: A equipa implementará um checklist de pontos a serem abordados nas reuniões diárias, com o objetivo de melhorar o foco e a eficácia nas comunicações. Será também feita uma avaliação contínua da qualidade das reuniões e da comunicação entre os membros do grupo.

6. Ações Corretivas da Retrospectiva Anterior

No Sprint anterior, não foi realizada uma retrospectiva formal, o que impediu a definição de ações corretivas específicas. No entanto, para a próxima Sprint, a equipa compromete-se a seguir o plano de ação definido na retrospectiva atual, focando-se nas áreas de melhoria identificadas.

7. Conclusões e Próximos Passos

A retrospectiva da Sprint 2 foi um momento importante para a análise crítica da nossa evolução como equipa. Durante esta reunião, conseguimos identificar os pontos fortes que contribuíram para o sucesso do Sprint, assim como as áreas que precisam de melhorias. As ações corretivas definidas foram práticas e específicas, e a sua implementação do Sprint que se segue permitirá que a equipa continue a melhorar e a atingir os seus objetivos de forma mais eficaz.

É fundamental que todas as ações corretivas sejam acompanhadas de perto, com evidências claras de execução, para garantir o seu sucesso. Para isso, a equipa vai monitorizar o progresso dessas ações e ajustar o plano sempre que necessário, assegurando que a melhoria contínua seja um esforço constante e não pontual.

A equipa compromete-se a continuar o processo de melhoria contínua, com o objetivo de alcançar melhores resultados no Sprint 3, superando os desafios que surgirem e aproveitando as oportunidades para otimizar os nossos processos de desenvolvimento e entrega. O objetivo é construir um ambiente de trabalho cada vez mais colaborativo e eficiente, onde todos os membros possam crescer e contribuir para o sucesso do projeto.
