


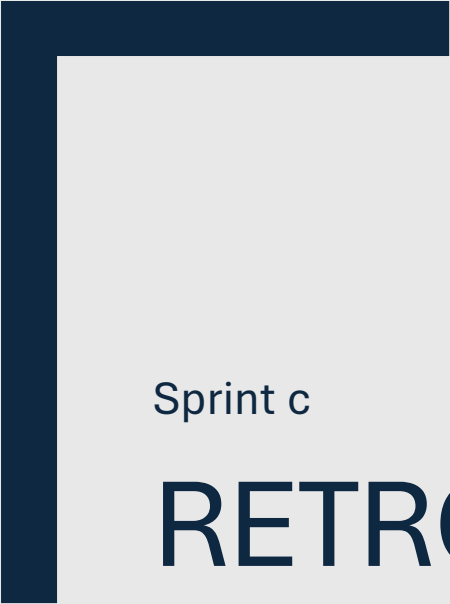

Sprint c

RETROSPETIVA


3DB – G10

António Pereira – 1220754

Alejandro Vieira – 1211981

João Pinto – 1221294

Carlos Santos - 1201367

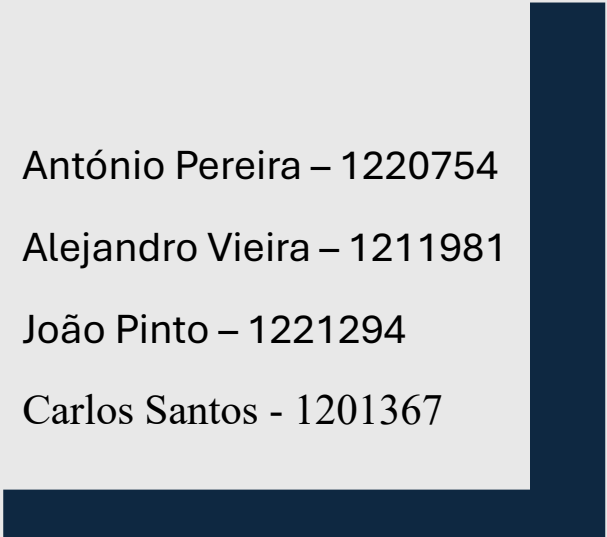

Indice

1. OBJETIVO DA RETROSPETIVA	2
2. RESUMO DO SPRINT 2	3
3. PONTOS POSITIVOS	4
4. PONTOS A MELHORAR	5
5. CONCLUSÃO E REFLEXÕES FINAIS	6
6. APRENDIZAGENS IMPORTANTES	6
7. ENCERRAMENTO DO PROJETO	7
8. CONCLUSÃO FINAL	7

1. Objetivo da Retrospectiva

O objetivo desta retrospectiva foi avaliar o desempenho da equipa ao longo do Sprint 3, o qual assinalou o encerramento do projeto e representou o culminar de todo o trabalho desenvolvido. Este momento de reflexão foi essencial para identificar as principais aprendizagens, celebrar os sucessos alcançados e analisar os desafios enfrentados durante este sprint final, garantindo uma visão global e crítica do progresso realizado.

Adicionalmente, a retrospectiva proporcionou uma oportunidade para consolidar as lições aprendidas ao longo de todas as etapas do projeto, permitindo que a equipa reconhecesse as boas práticas implementadas e identificasse áreas de melhoria a considerar em projetos futuros. Foi também um momento valioso para fomentar a partilha de experiências, reforçar o espírito de equipa e garantir um encerramento positivo e motivador da experiência coletiva, reconhecendo o esforço e a dedicação de todos os envolvidos.

Esta retrospectiva, para além de cumprir o seu propósito de análise e reflexão, foi um marco importante para assegurar que os aprendizados se transformem em alicerces para futuros desafios, contribuindo para a evolução contínua da equipa.

2. Resumo do Sprint 2

Sendo o último sprint, o foco esteve na conclusão das funcionalidades críticas, resolução de pendências e entrega final do projeto. Este sprint representou a reta final de um trabalho intenso e colaborativo, onde cada membro da equipa contribuiu para garantir que os objetivos fossem cumpridos com sucesso. Entre os principais resultados alcançados, destacam-se:

- **Finalização da Integração dos Módulos:** Garantiu-se que todos os módulos desenvolvidos funcionassem de forma totalmente integrada e sincronizada. Esta etapa envolveu ajustes finais na comunicação entre os componentes do sistema, resolvendo problemas anteriores de compatibilidade e garantindo um fluxo de dados consistente.
- **Aperfeiçoamento da Interface do Utilizador (UI):** Foi concluída a otimização da experiência do utilizador, com menus dinâmicos adaptados a diferentes papéis (como paciente, administrador e médico), maior fluidez na navegação, e uma apresentação visual mais intuitiva e responsiva. Estas melhorias contribuíram para uma usabilidade significativamente melhorada.
- **Validação de Conformidade com GDPR:** Realizou-se a última auditoria interna para assegurar que todos os dados pessoais fossem tratados de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR). Isto incluiu ajustes nos processos de armazenamento e processamento de dados, garantindo que o sistema cumprisse os requisitos legais e éticos.
- **Entrega de Documentação Completa:** Foram finalizados os manuais de utilizador e a documentação técnica detalhada, incluindo diagramas do sistema, fluxos de trabalho e instruções para manutenção futura. Esta entrega assegura que tanto os utilizadores finais como os técnicos que futuramente trabalhem no sistema tenham os recursos necessários para uma utilização e gestão eficazes.
- **Testes Finais e Feedback:** Realizaram-se testes exaustivos com utilizadores finais, onde todas as funcionalidades foram validadas. O feedback recolhido foi utilizado para realizar ajustes finais no sistema, garantindo que a entrega estivesse alinhada com as expectativas dos stakeholders e cumprisse os critérios de aceitação definidos no início do projeto.

Apesar de ser um sprint de alta intensidade, a equipa demonstrou resiliência, colaboração e foco na qualidade para alcançar os objetivos propostos. Todos os desafios encontrados foram superados com soluções eficazes, e o projeto foi entregue dentro do prazo estipulado, cumprindo os requisitos definidos.

Além disso, o Sprint 3 consolidou-se como um exemplo de como o trabalho em equipa, aliado a uma comunicação eficaz e uma abordagem estruturada, pode levar ao sucesso de um projeto. Este marco final não apenas reflete a qualidade do trabalho desenvolvido, mas também reforça as competências e o crescimento da equipa ao longo do processo.

3. Pontos Positivos

Conclusão do Projeto: A equipa conseguiu finalizar todas as funcionalidades previstas, garantindo a entrega de um sistema funcional, robusto e alinhado com os requisitos iniciais. Este resultado reflete não apenas a competência técnica da equipa, mas também o compromisso com a qualidade e os prazos estabelecidos.

Resolução de Problemas Complexos: Durante o sprint final, foram superados os desafios técnicos mais exigentes, como a sincronização total entre módulos, garantindo o fluxo correto de dados e operações, e os ajustes finais na interface do utilizador (UI), otimizando a experiência e a usabilidade. Estas resoluções foram cruciais para o sucesso do projeto e demonstram a capacidade da equipa em lidar com problemas de alta complexidade.

Colaboração e Resiliência: A equipa demonstrou uma colaboração notável, mantendo uma comunicação constante e eficaz, mesmo em momentos de maior pressão. A resiliência e o espírito de equipa foram fatores determinantes para que o sprint final fosse concluído com sucesso, evidenciando o amadurecimento do grupo ao longo do projeto.

Documentação Completa e de Qualidade: A entrega da documentação técnica e dos manuais de utilizador foi um dos pontos altos deste sprint. Estes materiais foram desenvolvidos de forma detalhada e clara, abrangendo todos os aspetos do sistema, desde a sua arquitetura e funcionamento até às instruções para os utilizadores finais. Esta documentação não só garante a longevidade do projeto como facilita futuras manutenções e melhorias.

Testes e Validação: O sprint final incluiu uma bateria de testes rigorosos para validar a funcionalidade, o desempenho e a conformidade com os critérios de aceitação definidos. O feedback recolhido durante este processo foi integrado em ajustes finais, assegurando que o sistema fosse entregue sem falhas críticas e completamente funcional.

Encerramento Positivo: O projeto foi encerrado de forma organizada e com uma avaliação geral positiva. A equipa conseguiu não apenas cumprir os objetivos técnicos, mas também criar um ambiente de trabalho colaborativo e produtivo. O resultado final é um sistema que cumpre os requisitos e apresenta alto valor agregado para os utilizadores finais, com o potencial de ser escalável e adaptado a futuras necessidades.

Este sprint final foi, assim, um reflexo de todo o esforço, aprendizagem e evolução acumulados ao longo do projeto. A equipa não só alcançou os objetivos, como demonstrou maturidade, adaptabilidade e uma forte capacidade de entrega, marcando este encerramento como um sucesso.

4. Pontos a Melhorar

Embora este tenha sido o sprint final e o projeto tenha sido concluído com sucesso, é essencial refletir sobre os desafios enfrentados e identificar áreas de melhoria para projetos futuros. Estas lições aprendidas podem ser fundamentais para otimizar a eficiência, reduzir a pressão nas etapas finais e assegurar um processo ainda mais fluido:

- **Gestão de Tempo:** A carga de trabalho durante a fase final do projeto foi bastante elevada, refletindo uma concentração excessiva de tarefas críticas no último sprint. Este desafio poderia ter sido mitigado com uma distribuição mais equilibrada das atividades ao longo dos sprints anteriores. Em projetos futuros, é fundamental planejar de forma mais estratégica, priorizando a conclusão gradual de funcionalidades importantes e reservando espaço no último sprint apenas para refinamentos e testes finais.
- **Antecipação de Testes:** Apesar de os testes finais terem sido realizados com sucesso, a antecipação de testes mais abrangentes nos sprints iniciais poderia ter permitido identificar e corrigir problemas mais cedo no processo. Adotar uma abordagem de "testar à medida que se desenvolve" (test-driven development) ou incorporar sprints dedicados a testes pode ajudar a garantir que o produto evolua com menos falhas acumuladas.
- **Sincronização Técnica Antecipada:** Os problemas relacionados à integração técnica entre módulos só foram totalmente resolvidos durante o último sprint, o que aumentou a pressão na fase final. Uma abordagem mais proativa, com sessões de integração e testes entre os módulos em sprints anteriores, teria minimizado estes desafios. Garantir que as dependências técnicas sejam abordadas com antecedência é essencial para evitar complicações de última hora.
- **Comunicação nas Fases Finais:** Embora a comunicação tenha melhorado ao longo do projeto, a sua frequência e clareza poderiam ter sido ainda mais reforçadas durante as semanas finais. Alinhamentos mais regulares e focados, especialmente para acompanhar as tarefas críticas e as dependências, poderiam ter prevenido pequenos mal-entendidos e retrabalhos. Implementar protocolos de reuniões rápidas (daily stand-ups) com um foco claro nas prioridades pode ser uma prática valiosa para garantir o alinhamento constante da equipa.
- **Gestão de Riscos:** Não houve um plano formal para gerir riscos identificados ao longo do projeto, como atrasos em funcionalidades críticas ou dificuldades de integração. Adotar uma abordagem mais estruturada de análise e mitigação de riscos em futuros projetos poderia ajudar a antecipar e a resolver desafios antes que se tornem problemas maiores.

Esses pontos de melhoria refletem áreas específicas que, se otimizadas, podem garantir maior eficiência, reduzir o stress nas fases finais e elevar ainda mais a qualidade do trabalho entregue. A aprendizagem contínua e a aplicação prática dessas lições em projetos futuros contribuirão significativamente para o crescimento da equipa e o sucesso em desafios futuros.

5. Conclusão e Reflexões Finais

A retrospectiva do Sprint 3 não se limitou a avaliar o último ciclo, mas também representou uma análise abrangente de todo o percurso do projeto. Este sprint final destacou-se pela dedicação, esforço coletivo e compromisso da equipa em entregar um produto final de alta qualidade, totalmente alinhado com os objetivos estabelecidos no início do projeto.

Este momento de encerramento permitiu consolidar as principais aprendizagens e celebrar os sucessos alcançados, ao mesmo tempo que foram identificados pontos de melhoria fundamentais para projetos futuros.

6. Aprendizagens Importantes

Entre os ensinamentos mais significativos que emergiram durante o projeto, destacam-se:

- **Planeamento Equilibrado:** A necessidade de distribuir melhor as tarefas e entregas ao longo dos sprints para evitar sobrecargas nos momentos finais. A gestão eficiente de tempo e recursos é um fator-chave para evitar pressões desnecessárias e melhorar a produtividade da equipa.
- **Antecipação de Testes e Validações:** A realização de testes contínuos e a validação antecipada de funcionalidades podem evitar acúmulo de problemas e garantir uma entrega final mais fluida e sem falhas.
- **Comunicação Contínua e Eficaz:** A comunicação foi identificada como um pilar fundamental para o sucesso da equipa. Manter um fluxo constante e claro de informações desde o início do projeto é essencial para alinhar expectativas e resolver impedimentos de forma rápida e eficaz.
- **Colaboração e Adaptação:** O projeto evidenciou a importância de um ambiente colaborativo e de uma equipa resiliente, capaz de se adaptar aos desafios com flexibilidade e criatividade.

7. Encerramento do Projeto

Com a conclusão deste sprint, o projeto reflete não apenas o cumprimento dos requisitos técnicos e funcionais, mas também a evolução da equipa ao longo do processo. Este crescimento foi visível na melhoria da comunicação, no fortalecimento da capacidade de resolução de problemas e no espírito de equipa, que se manteve presente mesmo sob os maiores desafios.

O produto final entregue é um sistema robusto, funcional e de grande valor agregado para os utilizadores finais. A documentação completa e detalhada, aliada aos testes rigorosos realizados, assegura que o sistema está preparado para operação e futuras manutenções.

Reflexões para Projetos Futuros

As lições aprendidas neste projeto serão uma base sólida para melhorar os processos em futuros desafios. Entre os principais focos de melhoria para projetos futuros, destacam-se:

- Implementação de práticas de gestão de tempo mais estratégicas e proativas.
- Maior integração de práticas de teste contínuo ao longo do desenvolvimento.
- Investimento numa comunicação ainda mais estruturada e eficiente.
- Planeamento mais robusto para lidar com riscos e dependências técnicas.
-

8. Conclusão Final

O Sprint 3 foi, sem dúvida, um exemplo do esforço e da dedicação da equipa em alcançar a excelência. Apesar dos desafios, o projeto foi concluído com sucesso, demonstrando o valor de um trabalho colaborativo, de uma mentalidade orientada para a melhoria contínua e de uma abordagem centrada na entrega de valor.

A equipa pode orgulhar-se do resultado alcançado, que não é apenas um reflexo do trabalho técnico, mas também do crescimento individual e coletivo. Este projeto deixa um legado de aprendizagens, experiências e conquistas que certamente servirão de inspiração e orientação para desafios futuros.
